

特定漁港漁場整備事業の廃止について（公表）

1 地区名（漁港名）

室戸東地区（高岡漁港）

2 廃止の理由

| 廃止する施設 | 廃止の理由 |
|--------------------------|--|
| (漁港施設) 消波堤 L=350m | 登録漁船隻数の減少により、荒天時においても現況でけい船岸の所要延長が確保されることとなり、整備の必要性が薄れてきたことから廃止する。 |
| (漁場施設) 増殖場 A=1.2ha | 消波堤の整備により創出される静穏域を活用した漁場整備であることから、消波堤とあわせて廃止とする。 |

3 当該事業及びその関連事業の進捗状況に関する事項

(漁港施設)

(単位：百万円)

| 都道府県名 | 整備対象漁港名 | 漁港種類 | 所管 | 事業主体名 | 漁港管理者名 | | | |
|--------|---------------------|------|-------|-------|----------|--------------|---------------|----------|
| 高知県 | 高岡漁港 | 1種 | 本土 | 高知県 | 高知県 | | | |
| 計画施設 | 計画工事種目 | 計画数量 | | | 事業実施済み数量 | | | 廃止 工種 |
| | | 単位 | 計画数量 | 計画事業費 | 単位 | 事業実施 済み数量 | 事業実施 済み事業費 | |
| 外郭施設 | 防波堤(改良) | m | 102 | 150 | m | 66.7 | 44.8 | |
| | 護岸 | m | 60.4 | 160 | m | 60.4 | 107.5 | |
| | 消波堤 | m | 350 | 1,980 | m | 0 | 0.0 | ○ |
| 輸送施設 | 臨港道路 | m | 35 | 5 | m | 35 | 2.2 | |
| 漁港施設用地 | 用地 | m2 | 2,700 | 60 | m2 | 2,700 | 53.6 | |
| | (蓄・養殖施設) | m3 | 1,000 | | m3 | 1,000 | | |
| | 用地(加工場) | m2 | 1,100 | 5 | m2 | 1,100 | 7.3 | |
| | 用地(野積場防 塵処理)(改良) | m2 | 1,200 | 5 | m2 | 1,200 | 2.4 | |
| | 用地(網干場防 塵処理)(改良) | m2 | 5,200 | 10 | m2 | 5,200 | 10 | |
| 計 | | | | 2,375 | | | 227.8 | |

(漁場施設)

(単位：百万円)

| 都道府県名 | 整備対象漁場名 | 所管 | 事業主体名 | 関係市町村名 | 対象生物 | | | |
|-------|------------------|------|---------|--------|-----------------------|--------------|---------------|----------|
| 高知県 | 高岡漁場 | 本土 | 高知県、室戸市 | 室戸市 | カジメ等の海藻、アワビ、トコブシ、伊勢エビ | | | |
| 計画施設 | 計画工事種目 | 計画数量 | | | 事業実施済み数量 | | | 廃止 工種 |
| | | 単位 | 計画数量 | 計画事業費 | 単位 | 事業実施 済み数量 | 事業実施 済み事業費 | |
| 増殖場 | 着堤基質 (藻礁ブロック) | ha | 1.2 | 200 | ha | 0 | 0 | ○ |

(関連事業による施設整備の進捗状況)

| 施設名 | 施設の規模と内容 | 施設の進捗状況 |
|-------------------------|---|--|
| 荷捌所 | 敷地 2,392m ² 建物 585m ² | 事業主体：高知県漁業協同組合 (高岡支所) 整備年次：昭和52年～平成元年 |
| 水産種苗生産施設 (採卵用親魚育成施設) | 建物 600m ² 30t水槽：4基 5t水槽：4基 | 事業主体：高知県 整備年次：平成13年 |
| 海洋深層水供給施設 (アケアーム) | 敷地 3,367m ² 建物 540m ² (給水能力：水産利用2,000t/日) | 事業主体：室戸市 整備年次：平成12年 |
| 製氷貯氷施設 | 敷地 3,169m ² 建物 221m ² | 事業主体：高知県漁業協同組合 (高岡支所) 整備年次：平成12年～平成13年 |
| 水産加工場 | 敷地 1,100m ² 建物 410m ² | 事業主体：高知県漁業協同組合 (高岡支所) 整備年次：平成15年～平成16年 |
| 蓄・養殖施設 | 敷地 2,700m ² 0.1t水槽—12水槽 1.5tFRP水槽—9水槽 7t+1t水槽—60水槽 ブロー—62台 | 事業主体：高知県漁業協同組合 (高岡支所) 整備年次：平成15年～平成16年 |
| 深層水実験施設 | 共同研究棟 780m ² | 事業主体：日本海洋開発産業協会 (高知県管理) 整備年次：平成15年 |

4 事業実施済み箇所の機能の発揮に関する事項

| 事業実施済み箇所の機能の発揮の様子 |
|---|
| <p>○防波堤（改良）（平成 14～15 年度事業実施） 計画延長 102m のうち、66.7m 施工済み。-1.5m 泊地に対する越波が大幅に減少し、静穏度が向上した。このことから残る 35.3m については未施工とし、完了とする。</p> |
| <p>○護岸（平成 14 年度事業実施） 背後用地の高潮・高波等からの保安が図られている。</p> |
| <p>○用地（蓄・養殖施設）（平成 14～15 年度事業実施） ○用地（加工場）（平成 14 年度事業実施） 漁港施設用地については、用地（蓄・養殖施設）A=2,700m²、用地（加工場）A=1,100m² の整備により、海洋深層水を利用したスジアオノリ養殖が行われ、漁業収益の向上に寄与している。</p> |
| <p>○用地（野積場防塵処理）（改良）（平成 15 年度事業実施） ○用地（網干場防塵処理）（改良）（平成 15～16 年度事業実施） 荷捌所への砂やホコリの飛散を防止することができ、水産物の衛生管理の向上が図られている。</p> |

5 廃止したことによる影響に関する事項

| 影響の内容 |
|--|
| <p>計画施設のうち、消波堤及び増殖場を除く施設は整備済みであり、当初の事業目的を果たしていることから、特定漁港漁場整備事業を廃止したことによる影響はない。</p> <p>「消波堤 L=350m」は、防波堤からの越波に対する泊地静穏度の向上のための施設であるが、地元漁船の隻数の減少により、現況のけい船岸のうち、荒天時においても安全な係留が可能なエリアで係留できるため、事業の廃止による影響はない。</p> <p>「増殖場 A=1.2ha」について、消波堤整備の副次的効果を利用した計画であるため廃止とする。</p> |




6 今後の課題と対応に関する事項

| |
|---|
| <p>本漁港の整備着手は第 2 次漁港整備長期計画（昭和 35 年）からであり、建設後 50 年を迎える施設が今後多くなる。平成 23 年度に策定した機能保全計画では、早急に保全工事が必要となる施設は一部であったが、今後、供用年数を経るに従い、老朽化対策が必要となる施設が増加することが予想される。このため、日常点検を実施し、漁港施設の機能保全と延命化に対応していく必要がある。</p> |
|---|

室戸東地区（高岡漁港）
特定漁港漁場整備事業計画平面図

| | | | | | |
|---------|-----|----|------|-----|--------------|
| 漁港番号 | 種別 | 所管 | 事業主体 | 管理者 | 施行場所 |
| 4210050 | 第1種 | 本土 | 高知県 | 高知県 | 高知県室戸市室戸岬町高岡 |

参考図

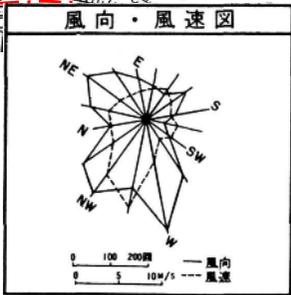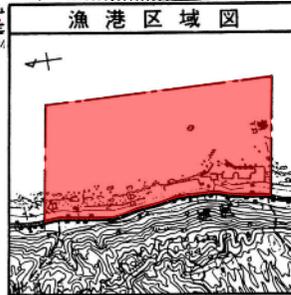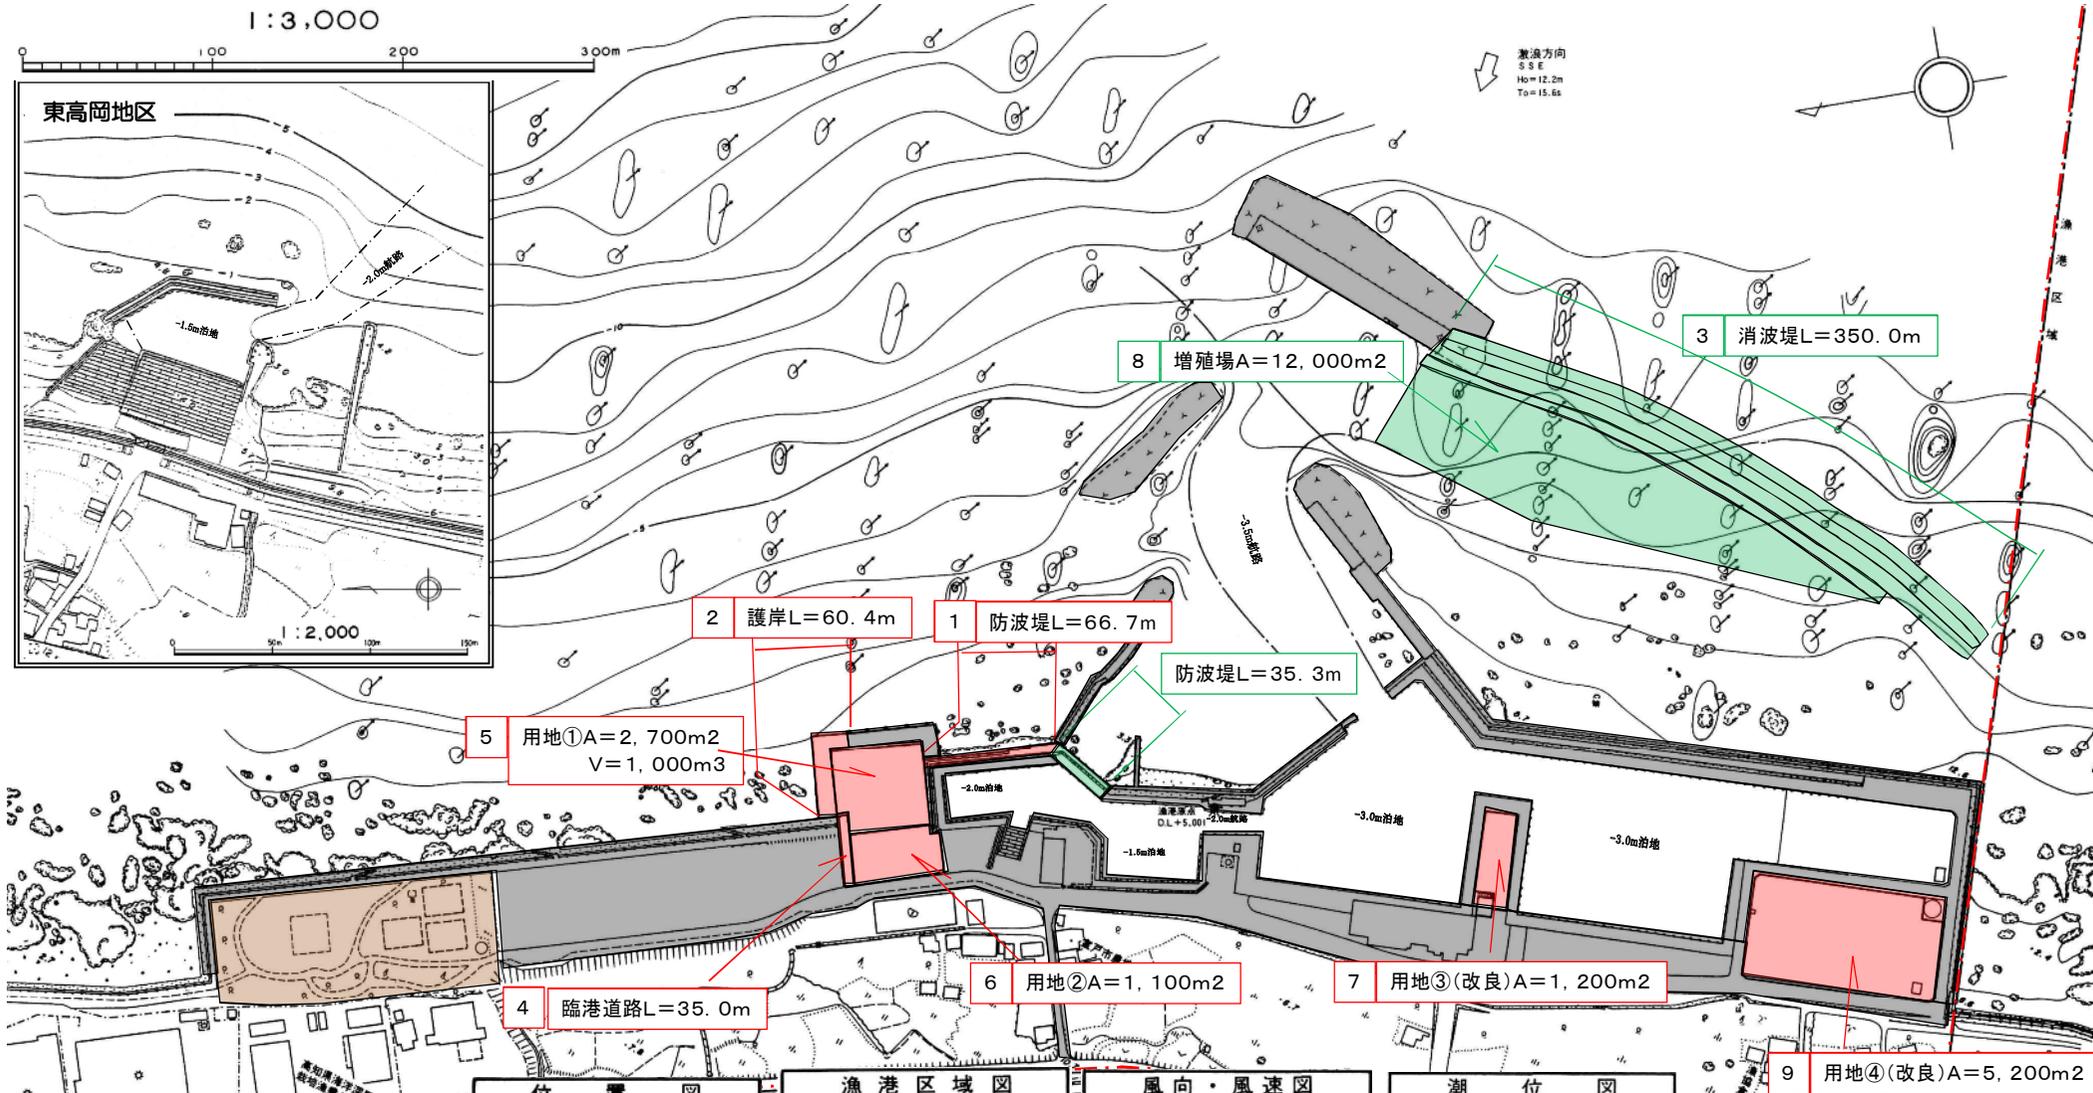

潮位図

| | |
|---------|-------|
| H.H.W.L | +3.60 |
| H.W.L | +1.80 |
| M.S.L | + |
| T.P | +1.30 |
| L.W.L | ±0.00 |
| C.D.L | |
| (D.L) | |

凡例

- 平成13年度までに完成した施設
- 当該事業基本計画
- 他事業 (平成13年度までに完成した施設)
- 他事業 (平成14年度以降の計画)
- 廃止施設
